

Data: 24/04/2026

Proposta Comercial

Cliente: KABOD CABANA

Local: Sorocaba - SP

Obra: 22 baias destinadas à contenção de bovinos.



Prezado Cliente,

Agradecemos a confiança e o interesse em nossos serviços.

É com satisfação que apresentamos esta proposta comercial, elaborada com base nas necessidades do seu projeto.

Permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ajustar o escopo se necessário e conduzir este processo de forma transparente e segura.

Será um prazer colaborar com a realização do seu projeto.



Nossa Solução Construtiva

A **Veks Engenharia** atua na construção civil com foco em **soluções modernas, eficientes e bem planejadas**, utilizando o sistema **Light Steel Frame (LSF)** como base de seus projetos. Nosso trabalho é guiado pela engenharia, pelo controle técnico e pela previsibilidade, garantindo obras bem executadas do início ao fim.

O **Light Steel Frame** é um sistema construtivo industrializado que oferece **rapidez na execução, alto controle de custos, menor desperdício e excelente desempenho térmico e acústico**. Essas características permitem uma obra mais limpa, organizada e com prazos mais confiáveis.



Com **mão de obra especializada**, atuação **multimarcas** e respeito rigoroso às normas técnicas, a Veks Engenharia entrega não apenas uma construção, mas um **processo construtivo seguro, eficiente e alinhado às exigências do mercado atual**.



Escopo

- Desenvolvimento de projeto estrutural em aço galvanizado Z275 engenheirado para 22 baias de contenção de bovinos, sendo cada baia 25m² e considerando pé direito de até 3 metros na parede de fundo e 1,5 m nas divisórias.
- Fornecimento de todo aço engenheirado e insumos para montagem, mão de obra para painelização e verticalização.
- Mão de obra para fechamento das paredes internas das baias com placas cimentícias e tratamento com impermeabilizantes para facilitar na limpeza da área.
- Mão de obra para fechamento das paredes externas com chapas de pinus.
- Mão de obra para execução de acabamento das paredes internas em cimento queimado.
- Mão de obra para pintura em Stain das ripas de pinus das paredes externas.
- Mão de obra para verticalização dos Pilares de tronco de eucalipto para apoio da estrutura em Light Steel Frame - Incluindo execução das sapatas e concreto armado.
- Mão de obra para instalação pedra Moledo até 1,5 m do chão nos pilares de tronco de eucalipto.
- Mão de obra para aplicação de resina sobre pedra Moledo;
- Fornecimento de material e mão de obra para realização de corredor de passagem com largura de 2 metros no perímetro das baias de contenção dos bovinos.
- Mão de obra para instalação de 01 ponto de iluminação em cada baia para os bovinos.
- Mão de obra para instalação de 01 luminária por pilar de tronco de eucalipto instalado nas baias.
- Mão de obra para instalação de placas osb e telha sanduíche na cobertura das 22 baias para os bovinos.
- Mão de obra para realização de pintura do aço estrutural do telhado na cor preta.
- Mão de obra para realização de pintura das placas osb do telhado na cor preta.
- Mão de obra para realização 01 ponto de drenagem no método de sumidouros com profundidade de 1 metro preenchido com brita e areia em cada baia dos bovinos.
- Mão de obra para execução de portão em madeira pinus fornecida pelo cliente.
- Mão de obra para pintura em Stain de portão em madeira pinus.
- Mão de obra para instalação de telhas Shingle.

Materia de apoio para desenvolvimento da proposta.

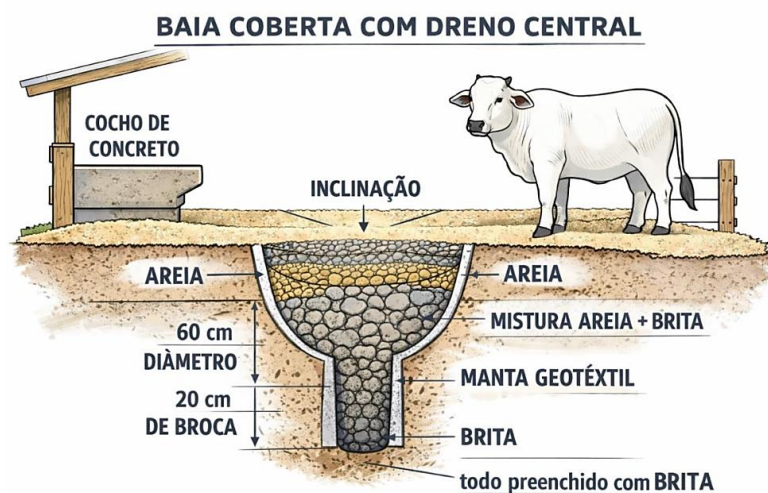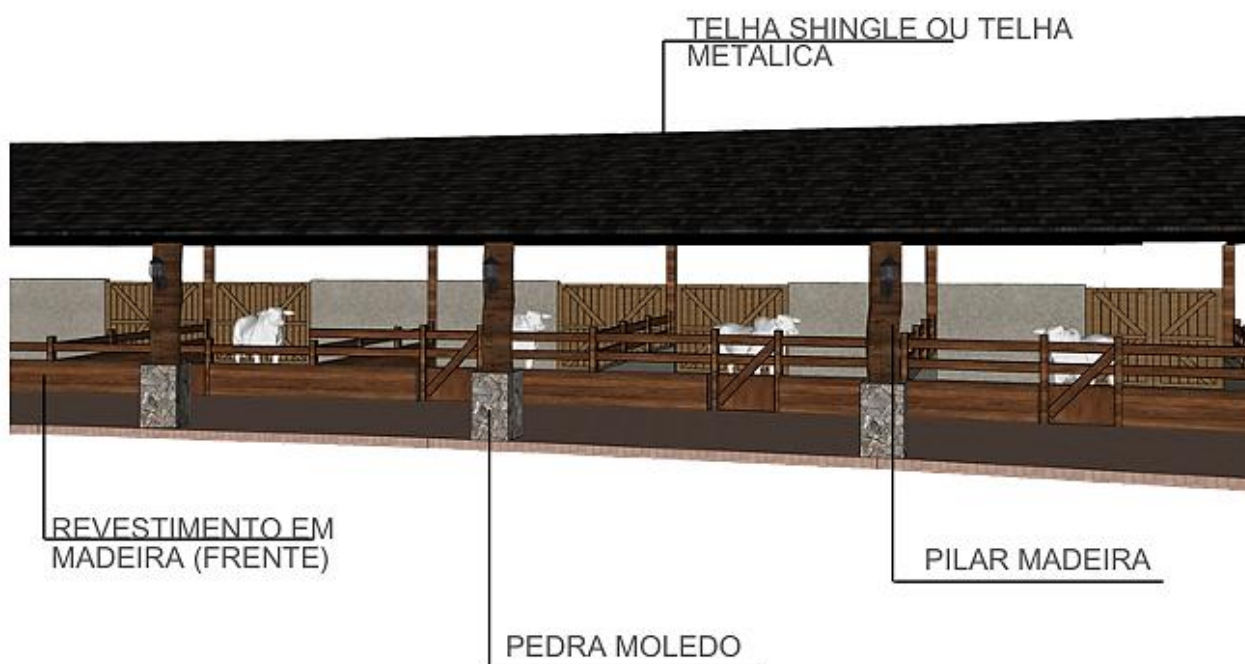

Valor do Investimento

Metragem considerada: valor fornecido pelo cliente sendo cada baia 25m².

Os valores abaixo referem-se ao fornecimento de materiais e à execução dos serviços descritos no escopo desta proposta.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso viga baldrame e todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 390.755,00	R\$ 228.389,83	R\$ 619.144,83
1.2	Pintura da estrutura do telhado e fundo de OSB do telhado shingle	m ²	850,00	R\$ -	R\$ 50.423,73	R\$ 50.423,73
1.3	Pintura em Stain em portão de Pinus	m ²	115,00	R\$ -	R\$ 6.822,03	R\$ 6.822,03
1.4	Execução de Portão em Pinus	m ²	115,00	R\$ -	R\$ 14.618,64	R\$ 14.618,64
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m ²	900,00	R\$ -	R\$ 114.406,78	R\$ 114.406,78
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias.	m ²	660,00	R\$ -	R\$ 83.898,31	R\$ 83.898,31
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 53.389,83	R\$ 53.389,83
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m ²	660,00	R\$ -	R\$ 39.152,54	R\$ 39.152,54
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	44,00	R\$ -	R\$ 42.372,88	R\$ 42.372,88
1.10	Corredor de passagem com 2m de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto	vb	1,00	R\$ 18.150,00	R\$ 14.355,93	R\$ 32.505,93
1.11	Revestimento em pedra moleto em pilares em até 1m de altura	m ²	40,00	R\$ -	R\$ 15.593,22	R\$ 15.593,22
1.12	Arandelas de iluminação nos pilares de tronco e 1 ponto de iluminação em cada baia	un.	1,00	R\$ -	R\$ 10.169,49	R\$ 10.169,49
1.13	Instalação de telha Shingle	m ²	850,00	R\$ -	R\$ 122.457,63	R\$ 122.457,63
1.14	Execução de drenagem das baias	un.	22,00	R\$ -	R\$ 18.644,07	R\$ 18.644,07
				TOTAL MATERIAIS	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL VENDA
<u>Valor Total do Projeto</u>				R\$ 408.905,00	R\$ 814.694,91	R\$ 1.223.599,91

As metragens consideradas se trata de uma estimativa, podendo ter variação.

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: 30% de entrada, e o saldo remanescente pago conforme medições periódicas, vinculadas ao progresso físico da obra e aos serviços efetivamente executados.

Prazo do serviço: 90 dias trabalhados.

Observações

- Os valores apresentados foram elaborados com base no escopo técnico definido nesta proposta;
- Qualquer alteração de escopo poderá implicar em revisão dos valores;
- Está proposta tem validade de 10 dias;

Considerações Finais

- Permanecemos à disposição para eventuais alinhamentos técnicos e adequações de escopo.
- A formalização da contratação ocorrerá mediante aprovação desta proposta e assinatura do contrato, com posterior definição do cronograma executivo

Assinatura do cliente
