

Data: 27/04/2026

Proposta Comercial

Cliente: KABOD CABANA

Local: Sorocaba - SP

Obra: 22 baias destinadas à contenção de bovinos.



Prezado Cliente,

Agradecemos a confiança e o interesse em nossos serviços.

É com satisfação que apresentamos esta proposta comercial, elaborada com base nas necessidades do seu projeto.

Permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ajustar o escopo se necessário e conduzir este processo de forma transparente e segura.

Será um prazer colaborar com a realização do seu projeto.



Nossa Solução Construtiva

A **Veks Engenharia** atua na construção civil com foco em **soluções modernas, eficientes e bem planejadas**, utilizando o sistema **Light Steel Frame (LSF)** como base de seus projetos. Nosso trabalho é guiado pela engenharia, pelo controle técnico e pela previsibilidade, garantindo obras bem executadas do início ao fim.

O **Light Steel Frame** é um sistema construtivo industrializado que oferece **rapidez na execução, alto controle de custos, menor desperdício e excelente desempenho térmico e acústico**. Essas características permitem uma obra mais limpa, organizada e com prazos mais confiáveis.



Com **mão de obra especializada**, atuação **multimarcas** e respeito rigoroso às normas técnicas, a Veks Engenharia entrega não apenas uma construção, mas um **processo construtivo seguro, eficiente e alinhado às exigências do mercado atual**.



Escopo

- Desenvolvimento de projeto estrutural em aço galvanizado Z275 engenheirado para 22 baias de contenção de bovinos, sendo cada baia 25m² e considerando pé direito de até 3 metros na parede de fundo e 1,5 m nas divisórias.
- Fornecimento de todo aço engenheirado e insumos para montagem, mão de obra para painelização e verticalização.
- Mão de obra para fechamento das paredes internas das baias com placas cimentícias e tratamento com impermeabilizantes para facilitar na limpeza da área.
- Mão de obra para fechamento das paredes externas com chapas de pinus fornecidos pelo cliente.
- Mão de obra para execução de acabamento das paredes internas em cimento queimado.
- Mão de obra para pintura em Stain das ripas de pinus das paredes externas e fornecimento do material.
- Mão de obra para verticalização dos Pilares de tronco de eucalipto para apoio da estrutura em Light Steel Frame - Incluindo execução das sapatas e concreto armado.
- Mão de obra para instalação pedra Moledo até 1,5 m do chão nos pilares de tronco de eucalipto.
- Mão de obra para aplicação de resina sobre pedra Moledo;
- Fornecimento de material e mão de obra para realização de corredor de passagem com largura de 2 metros no perímetro das baias de contenção dos bovinos.
- Mão de obra para instalação de 01 ponto de iluminação em cada baia para os bovinos e material - fornecimento de luminárias pelo cliente.
- Mão de obra para instalação de 01 luminária por pilar de tronco de eucalipto instalado nas baias e fornecimento de material - luminárias fornecidas pelo cliente.
- Mão de obra para instalação de placas osb e telha single na cobertura das 22 baias para os bovinos.
- Mão de obra para realização de pintura do aço estrutural do telhado na cor preta.
- Mão de obra para realização de pintura das placas osb do telhado na cor preta.
- Mão de obra para realização 01 ponto de drenagem no método de sumidouros com profundidade de 1 metro preenchido com brita e areia em cada baia dos bovinos.
- Mão de obra para execução de 02 portões por baia em madeira pinus fornecida pelo cliente.
- Mão de obra para pintura em Stain de portão em madeira pinus com fornecimento de material.
- Mão de obra para instalação de telhas Shingle.

Materia de apoio para desenvolvimento da proposta.

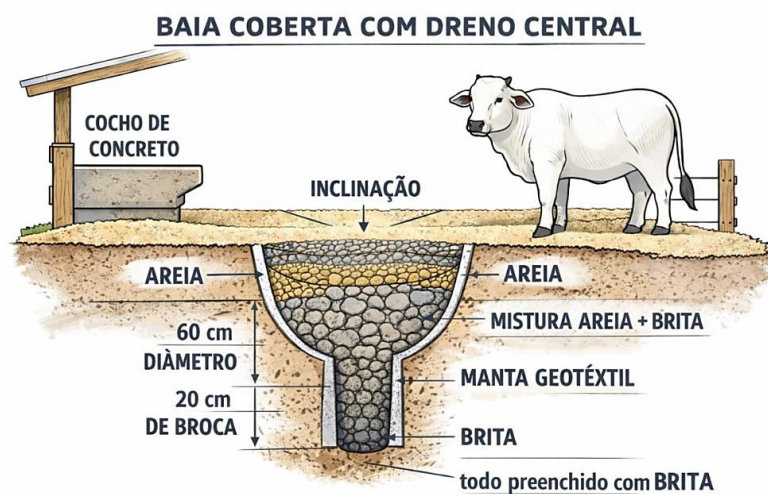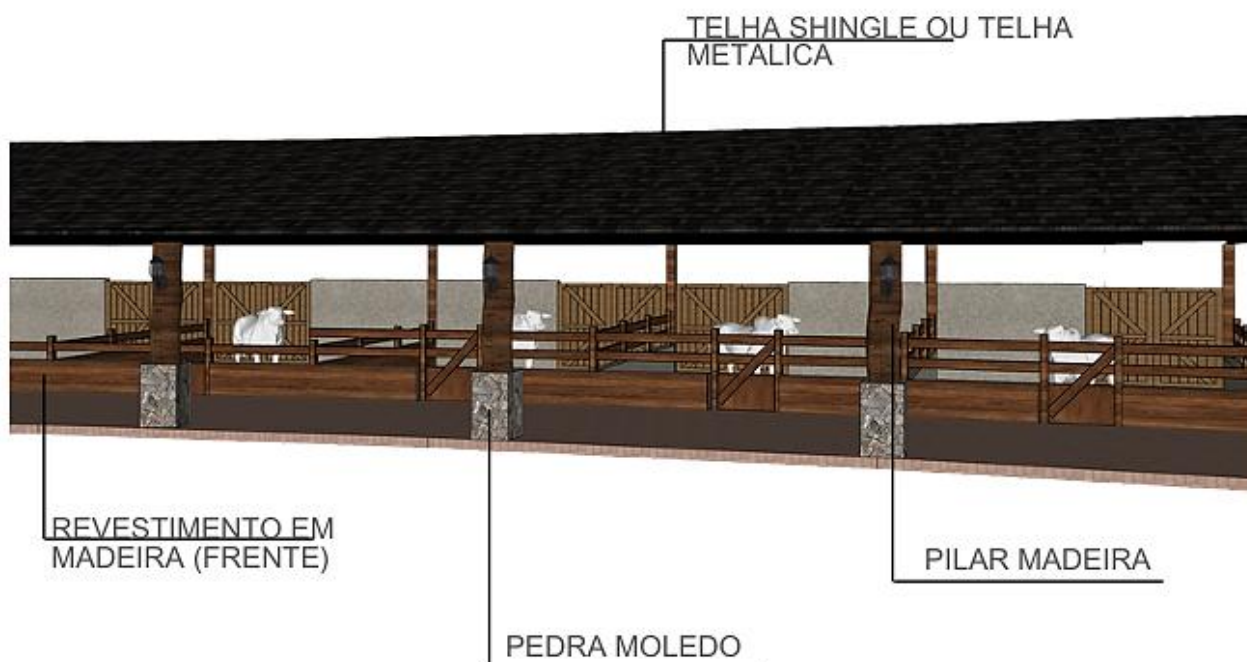

Valor do Investimento

Metragem considerada: valor fornecido pelo cliente sendo cada baia 25m².

Os valores abaixo referem-se ao fornecimento de materiais e à execução dos serviços descritos no escopo desta proposta.

1.0 - SERVIÇOS -						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 390.755,00	R\$ 228.389,83	R\$ 619.144,83
1.2	Pintura do aço estrutural LSF do telhado.	m ²	850,00	R\$ -	R\$ 50.423,73	R\$ 50.423,73
1.3	Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.	m ²	115,00	R\$ 115.000,00	R\$ 6.822,03	R\$ 121.822,03
1.4	Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente.	un.	44,00	R\$ -	R\$ 26.101,69	R\$ 26.101,69
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m ²	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.	m ²	660,00	R\$ -	R\$ 50.338,98	R\$ 50.338,98
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m ²	660,00	R\$ 1.000,00	R\$ 33.559,32	R\$ 34.559,32
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado	vb	44,00	R\$ -	R\$ 42.372,88	R\$ 42.372,88
1.10	Corredor de passagem com 2 metros de largura em concreto desempenado camurçado, incluso concreto.	vb	1,00	R\$ 24.562,50	R\$ 13.559,32	R\$ 38.121,82
1.11	Revestimento em pedra moleado em pilares em até 1m de altura	m ²	40,00	R\$ -	R\$ 15.593,22	R\$ 15.593,22
1.12	Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)	un.	1,00	R\$ 7.137,50	R\$ 11.016,95	R\$ 18.154,45
1.13	Instalação de telha Shingle	m ²	850,00	R\$ -	R\$ 122.457,63	R\$ 122.457,63
1.14	Execução de cercado em todas as baias com 2 régua de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das régua de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.	un.	22,00	R\$ 2.750,00	R\$ 16.779,66	R\$ 19.529,66
1.15	Pintura em Stain do cercado das baias.	un.	22,00	R\$ 22.000,00	R\$ 14.915,25	R\$ 36.915,25
1.16	Execução de cama de areia de 10cm	un.	22,00	R\$ 3.750,00	R\$ 4.474,58	R\$ 8.224,58
1.17	Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro	un.	22,00	R\$ 1.083,88	R\$ 3.728,81	R\$ 4.812,69
1.18	Execução de drenagem das baias	un.	22,00	R\$ 8.250,00	R\$ 5.593,22	R\$ 13.843,22
				TOTAL MATERIAIS	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL VENDA
Valor Total do Projeto				R\$ 576.288,88	R\$ 783.415,24	R\$ 1.359.704,12

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.

Prazo do serviço: 110 dias trabalhados.

Observações

- Os valores apresentados foram elaborados com base no escopo técnico definido nesta proposta;
- Qualquer alteração de escopo poderá implicar em revisão dos valores;
- Está proposta tem validade de 10 dias;

Considerações Finais

- Permanecemos à disposição para eventuais alinhamentos técnicos e adequações de escopo.
- A formalização da contratação ocorrerá mediante aprovação desta proposta e assinatura do contrato, com posterior definição do cronograma executivo

Assinatura do cliente
