

Data: 03/06/2026

# Proposta Comercial

**Cliente:** KABOD CABANA**Local:** Itu - SP**Obra:** 24 baias destinadas à contenção de bovinos, e área de apoio.

## Prezado Cliente,

Agradecemos a confiança e o interesse em nossos serviços.

É com satisfação que apresentamos esta proposta comercial, elaborada com base nas necessidades do seu projeto.

Permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ajustar o escopo se necessário e conduzir este processo de forma transparente e segura.

Será um prazer colaborar com a realização do seu projeto.



## Nossa Solução Construtiva

A **Veks Engenharia** atua na construção civil com foco em **soluções modernas, eficientes e bem planejadas**, utilizando o sistema **Light Steel Frame (LSF)** como base de seus projetos. Nosso trabalho é guiado pela engenharia, pelo controle técnico e pela previsibilidade, garantindo obras bem executadas do início ao fim.

O **Light Steel Frame** é um sistema construtivo industrializado que oferece **rapidez na execução, alto controle de custos, menor desperdício e excelente desempenho térmico e acústico**. Essas características permitem uma obra mais limpa, organizada e com prazos mais confiáveis.


Com **mão de obra especializada**, atuação **multimarcas** e respeito rigoroso às normas técnicas, a Veks Engenharia entrega não apenas uma construção, mas um **processo construtivo seguro, eficiente e alinhado às exigências do mercado atual**.



# Escopo

- Desenvolvimento de projeto estrutural em aço galvanizado Z275 engenheirado para 24 baias de contenção de bovinos, sendo cada baia 30 m<sup>2</sup> e considerando pé direito de até 3 metros na parede de fundo e 0,8 m nas divisórias de LST.
- Fornecimento de todo aço engenheirado e insumos para montagem, mão de obra para painelização e verticalização.
- Mão de obra para fechamento das paredes internas das baias com placas cimentícias e tratamento com impermeabilizantes para facilitar na limpeza da área.
- Mão de obra para fechamento das paredes externas com chapas de pinus fornecidos pelo cliente.
- Mão de obra para execução de acabamento das paredes internas em cimento queimado.
- Mão de obra para pintura em Stain das ripas de pinus das paredes externas e fornecimento do material.
- Mão de obra para verticalização dos Pilares de tronco de eucalipto para apoio da estrutura em Light Steel Frame – Incluindo execução das sapatas e concreto armado.
- Mão de obra para instalação pedra Moledo até 1,5 m do chão nos pilares de tronco de eucalipto.
- Mão de obra para aplicação de resina sobre pedra Moledo;
- Fornecimento de material e mão de obra para realização de 02 corredores de passagem com largura de 2 metros no perímetro das baias de contenção dos bovinos.
- Mão de obra para instalação de 01 ponto de iluminação em cada baia para os bovinos e material – fornecimento de luminárias pelo cliente.
- Mão de obra para instalação de 01 luminária por pilar de tronco de eucalipto instalado nas baias e fornecimento de material – luminárias fornecidas pelo cliente.
- Mão de obra para realização de pintura do aço estrutural do telhado na cor preta.
- Mão de obra para execução de 02 portões por baia em madeira pinus fornecida pelo cliente.
- Mão de obra para pintura em Stain de portão em madeira pinus com fornecimento de material.
- Mão de obra para instalação de telhas Shingle.
- Montagem completa de área de apoio para 32m<sup>2</sup>

Materia de apoio para desenvolvimento da proposta.

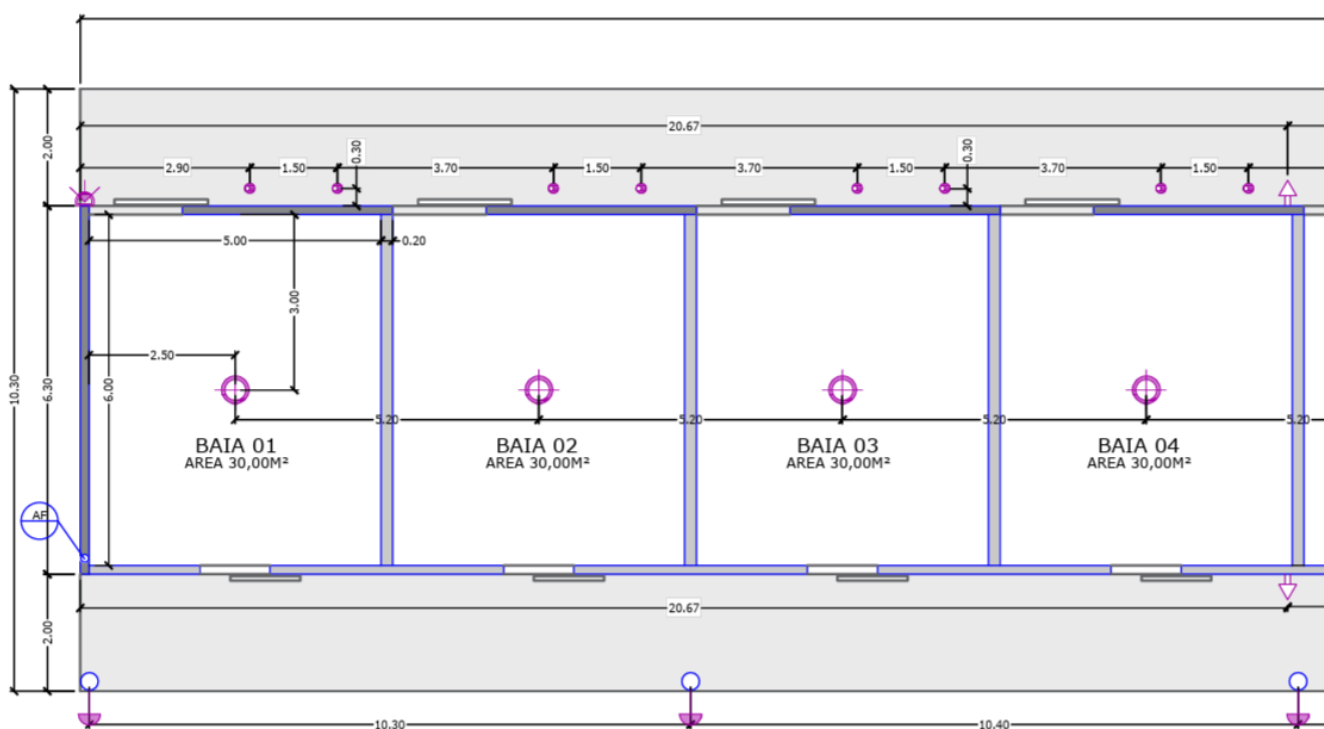

PLANTA BAIXA BAIAS - BLOCO 1 (01 A 12)



## CROQUI



# Valor do Investimento

**Metragem considerada:** valor fornecido pelo cliente sendo cada baia 30 m<sup>2</sup>.

Os valores abaixo referem-se ao fornecimento de materiais e à execução dos serviços descritos no escopo desta proposta.

| 1.0 - SERVIÇOS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                |                |                       |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANT.  | MAT VENDA      | M.O. VENDA     | TOTAL MATERIAL        | TOTAL M.O.            | TOTAL                   |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Execução de baias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                |                |                       |                       |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vb    | 1,00    | R\$ 441.794,00 | R\$ 259.830,51 | R\$ 441.794,00        | R\$ 259.830,51        | R\$ 701.624,51          |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pintura do aço estrutural LSF do telhado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 1173,00 | R\$ -          | R\$ 59,32      | R\$ -                 | R\$ 69.584,75         | R\$ 69.584,75           |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 161,00  | R\$ 1.000,00   | R\$ 59,32      | R\$ 161.000,00        | R\$ 9.550,85          | R\$ 170.550,85          |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente. Trilho para portão, 1 por baia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un.   | 48,00   | R\$ 156,25     | R\$ 593,23     | R\$ 7.500,00          | R\$ 28.474,58         | R\$ 35.974,58           |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 900,00  | R\$ -          | R\$ 76,27      | R\$ -                 | R\$ 68.644,07         | R\$ 68.644,07           |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²    | 660,00  | R\$ -          | R\$ 76,27      | R\$ -                 | R\$ 50.338,98         | R\$ 50.338,98           |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vb    | 900,00  | R\$ -          | R\$ 76,27      | R\$ -                 | R\$ 68.644,07         | R\$ 68.644,07           |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 660,00  | R\$ 1.000,00   | R\$ 50,85      | R\$ 1.000,00          | R\$ 33.559,32         | R\$ 34.559,32           |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estruturação e verticalização de Pilares rolíços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vb    | 32,00   | R\$ -          | R\$ 963,02     | R\$ -                 | R\$ 30.816,64         | R\$ 30.816,64           |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Execução de 02 corredores de passagem com 2 metros de largura cada em concreto desempenado camurçado, incluso concreto, no perímetro das baias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vb    | 1,00    | R\$ 70.680,00  | R\$ 25.440,68  | R\$ 70.680,00         | R\$ 25.440,68         | R\$ 96.120,68           |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Revestimento em pedra moleto em pilares em até 1m de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 40,00   | R\$ -          | R\$ 389,83     | R\$ -                 | R\$ 15.593,22         | R\$ 15.593,22           |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un.   | 1,00    | R\$ 8.637,50   | R\$ 11.016,95  | R\$ 8.637,50          | R\$ 11.016,95         | R\$ 19.654,45           |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalação de telha Shingle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 1173,00 | R\$ -          | R\$ 144,07     | R\$ -                 | R\$ 168.991,53        | R\$ 168.991,53          |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Execução de cercado em todas as baias com 2 reguas de tábuas e pilares de 12x12cm - fornecimento das reguas de tábuas e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un.   | 24,00   | R\$ 125,00     | R\$ 762,71     | R\$ 3.000,00          | R\$ 18.305,08         | R\$ 21.305,08           |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pintura em Stain do cercado das baias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un.   | 24,00   | R\$ 1.000,00   | R\$ 677,97     | R\$ 24.000,00         | R\$ 16.271,19         | R\$ 40.271,19           |
| 1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un.   | 24,00   | R\$ 1.083,88   | R\$ 169,49     | R\$ 1.083,88          | R\$ 4.067,50          | R\$ 5.151,68            |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projeto de fundação<br>Apo para vigas baldrame de borda do radier e malha piso armado CA50/CA60<br>Execução de forma para vigas baldrame e radier<br>Concretagem das vigas de bordas e radier, execução de radier polido<br>Regularização de radier para recebimento do piso<br>Projeto Estrutural + Aço Engenheirado (ZAR230 Z275)<br>Execução de Painelização e Verticalização, contemplando todos os insumos necessários para a realização do serviço, incluindo fixadores, parafusos, bandas acústicas e demais acessórios.<br>Fechamento Interno e Externo<br>Instalação de madeira regua pinus<br>Isolamento<br>PAINEL LA DE ROCHA 32KG/M3 1200X600X50MM 4.32M2 6PC<br>Execução de Ferro Interno<br>"Ponto em PVC preto"<br>Execução de Infra elétrica para interruptores e tomadas<br>Execução de infra para iluminação<br>Execução de circuitos e cabamentos<br>Execução de acabamentos de tomadas e interruptores<br>Montagem de quadro elétricos<br>Instalações"<br>Execução de tubulações de esgoto<br>Execução de tubulações de água fria<br>Execução de caixas de gordura<br>Execução de registros<br>Pintura da madeira em stain<br>ITENS NÃO INCLUSOS<br>MAT: telha single, louças metais, madeiras, pré moldados e esquadrias | VB    | 1,00    | R\$ 58.025,88  | R\$ 52.419,44  | R\$ 58.025,88         | R\$ 52.419,44         | R\$ 110.445,33          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                |                | TOTAL MATERIAIS       | TOTAL MÃO DE OBRA     | TOTAL VENDA             |
| <b>Valor Total do Projeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                |                | <b>R\$ 776.721,26</b> | <b>R\$ 931.549,66</b> | <b>R\$ 1.708.270,93</b> |
| Validade da proposta: 10 DIAS<br>FORMA DE PAGAMENTO: entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.<br><br>Garantia sobre o serviço de 5 anos.<br>PRAZO de 110 dias trabalhados<br>Material faturamento direto em nome do cliente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                |                |                       |                       |                         |

# Condições Comerciais

**Forma de Pagamento:** entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.

**Prazo do serviço:** 110 dias trabalhados.

|                                   | 04/06/2026 | 22/06/2026 | 10/10/2026 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ACEITA DA PROPOSTA                |            |            |            |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS |            |            |            |
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE             |            |            |            |
| ENTREGA DA OBRA                   |            |            |            |

# Observações

- Os valores apresentados foram elaborados com base no escopo técnico definido nesta proposta;
- Qualquer alteração de escopo poderá implicar em revisão dos valores;
- Está proposta tem validade de 10 dias;

# Considerações Finais

- Permanecemos à disposição para eventuais alinhamentos técnicos e adequações de escopo.
- A formalização da contratação ocorrerá mediante aprovação desta proposta e assinatura do contrato, com posterior definição do cronograma executivo

Assinatura do cliente
