

RDO, do cronograma à assinatura

Manual de uso do SIGE

Este manual segue um dia de obra inteiro, na ordem em que ele acontece no sistema: as atividades vêm do cronograma, o encarregado lança efetivo, terceiros, avanço, ocorrências e fotos, salva, submete, o gestor confere, o encarregado assina, o gestor aprova — e, se um erro aparecer depois, retifica.

Em cada tela, as caixas numeradas marcam o que precisa ser preenchido. Os campos com * são obrigatórios. A regra por trás de cada passo está no capítulo "RDO — Padrão de Preenchimento" do manual do sistema (/manual).

Antes de tudo

Entrar, e entender de onde o RDO vem.

1. Entrar no sistema

Quem faz: **qualquer pessoa** · Onde: /login

Quem lança RDO entra com o próprio usuário. O que aparece depois depende do papel na obra: apontador lança e assina; gestor reabre e aprova.

The image shows a login form with three numbered steps indicated by orange circles on the left. Step 1 is for the 'Username' field, which has a person icon. Step 2 is for the 'Senha' (Password) field, which has a lock icon. Step 3 is the 'Entrar' (Login) button, which is a large blue button with a right arrow icon and the text 'Entrar'.

#	Campo	O que preencher
1	Usuário ou e-mail *	Obrigatório.
2	Senha *	Obrigatório.
3	Entrar	—

2. O RDO é alimentado pelo cronograma

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /cronograma/obra/125046

As atividades que você vai apontar no RDO são ESTAS. O RDO não tem lista própria: ele lê o cronograma da obra, e cada apontamento volta para cá como avanço.

#	NOME DA TAREFA	DUR.	INÍCIO (PLAN.)	TÉRMINO (PLAN.)	PRED.	QTD / UN.	RESPONSÁVEL	% PLANEJADO	% REALIZADO
1	▼ Fundações	149d	03/08/26	30/12/26	—	—	Empresa	10%	0.0%
2	Estacas hélice contínua	149d	03/08/26	30/12/26	—	120 un	Terceiros	—	Pendente
3	Blocos de coroamento	142d	10/08/26	30/12/26	—	24 un	Empresa	7%	0%
4	▼ Estrutura metálica	135d	17/08/26	30/12/26	—	—	Empresa	3%	0.0%
5	Montagem de pilares	135d	17/08/26	30/12/26	—	—	Empresa	3%	0%
6	Liberção da estrutura pela fiscalização	1d	30/12/26	30/12/26	—	—	Empresa	0%	0%

#	Campo	O que preencher
1	As atividades	Só as folhas (sem filhas) recebem apontamento. As fases somam as filhas.
2	Qtd / Un.	Atividade com quantidade e unidade é apontada por QUANTIDADE executada no dia. Sem quantidade, por percentual acumulado.
3	Responsável	"terceiros" é equipe de terceiro — mas o botão de terceiro existe em qualquer atividade.
4	% Realizado	Calculado automaticamente pelos apontamentos do RDO. Ninguém digita aqui.

Atenção: RDO em rascunho NÃO mexe nesta coluna. Só o RDO submetido.

3. Os RDOs da obra

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdos

Um RDO por obra, por dia trabalhado. Aqui você vê o que já foi lançado e cria o de hoje.

SIGE

RDOs

Veículos

manualrdo_encarregado

Relatórios Diários de Obra

Selecione uma obra para ver seus RDOs

1

Galpão Logístico Vila Norte

MRDO-01

Sem RDOs ainda

0 RDOs

>

2

+ Novo RDO

#	Campo	O que preencher
1	A obra	—
2	Novo RDO	—

Ato 1 — Preencher o dia

Do cabeçalho às fotos, na ordem em que a tela pede.

4. Obra, data e clima

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdo/novo?obra_id=125046

O cabeçalho do dia: qual obra, que dia, como estava o tempo. A data é a do dia trabalhado — e o RDO é lançado no mesmo dia.

SIGE

RDOs

Veículos

manualdo_encarregado

Relatório Diário de Obra (RDO)

Sistema moderno e intuitivo para registro de atividades diárias

Voltar

Informações Básicas

1

Obra

Galpão Logístico Vila Norte

2

Data do Relatório

08/21/2026

3

Clima geral

Ensolarado

4

Temperatura média

29°C

Condições de trabalho

Selecione

Equipamentos

Adicionar

Equipamento / Ferramenta

Quantidade

Horas de uso

Estado de conservação

Deixe vazio para não registrar equipamentos.

Ocorrências

Adicionar

Tipo

Severidade

Descrição

Status

Deixe vazio para não registrar ocorrências.

Apontamento de Produção — Cronograma

Expandir todas

Recolher todas

Filtrar tarefas por nome...

Fundações

2 subtarefas

Planejado

10.1%

Realizado — Atrasado

0.0%

Estrutura metálica

2 subtarefas

Planejado

3.7%

Realizado — Atrasado

0.0%

Fotos do RDO

Selecionar fotos para anexar ao RDO

JPG, PNG, GIF, WEBP - Máximo 5MB por foto

Câmera

Galeria

As fotos serão enviadas junto com o RDO quando você clicar em "Finalizar RDO"

Observações e Ocorrências

Observações Finais

Descreva observações importantes, problemas encontrados, entregas recebidas, etc.

Voltar

Finalizar RDO

#	Campo	O que preencher
1	Obra *	Obrigatório.

2	Data do RDO *	A data do dia trabalhado — lançado NO MESMO DIA. Dois dias de atraso é motivo de devolução.
3	Clima	É o que sustenta a ocorrência de chuva quando ela vira discussão de prazo.
4	Temperatura	—

O que acontece: Ao escolher a obra, as atividades do cronograma aparecem abaixo.

5. As atividades, dentro do RDO

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

São as mesmas atividades do cronograma, agrupadas por fase — a fase abre recolhida; "Expandir todas" mostra as folhas. Em cada linha: onde apontar o avanço, e os dois botões — equipe própria e terceiro.

Apontamento de Produção — Cronograma

Expandir todas Recolher todas

Filtrar tarefas por nome...

Fundações 2 subtarefas

Planejado 10.1%

Realizado — Atrasado 0.0%

Estacas hélice contínua Terceiros Concluído

Blocos de coroamento Empresa Total: 24 un · Acum: 0 un · Saldo: 24 un Hoje 7.0%

Planejado 7.0%

Realizado — Atrasado 0.0%

Estrutura metálica 2 subtarefas

Planejado 3.7%

Realizado — Atrasado 0.0%

Montagem de pilares Empresa Ant: 0.0% % accl % 3.7%

Planejado 3.7%

Realizado — Atrasado 0.0%

Liberação da estrutura pela fiscalização Empresa Marco concluído 0.0%

Planejado 0.0%

Realizado — Em dia 0.0%

#	Campo	O que preencher
1	Expandir todas	As fases vêm fechadas. Só a folha recebe apontamento.
2	As atividades do cronograma	—
3	Quantidade de HOJE	Atividade por quantidade: o que foi executado hoje, não o acumulado. O sistema soma.
4	Percentual ACUMULADO	Atividade por percentual: o acumulado da atividade, não o do dia.
5	Marco	Marque só no dia em que ele de fato ocorreu.
6	Equipe própria	—
7	Terceiro	Existe em qualquer atividade, inclusive nas nossas.

6. Equipe própria — só quem é operacional

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

A lista traz só o pessoal OPERACIONAL. A Ana, do escritório, não aparece — a função dela está marcada como administrativa.

 **Blocos de coroamento** 

1

 Buscar funcionário...

2

 **Davi Montador** 

 **Lucas Soldador** 

 **Mateus Lira** 

 **Alocados nesta atividade**
Nenhum funcionário alocado

 **Confirmar**

#	Campo	O que preencher
1	Buscar pelo nome	—
2	Quem pode ser alocado	Quem trabalhou e não aparece aqui está com a função marcada como administrativa no cadastro — avise o escritório, não deixe de fora.

7. Quem esteve, e quantas horas

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

Cada pessoa com as horas NESTA atividade. Quem trabalhou em duas atividades aparece nas duas, com as horas divididas — a soma bate com a jornada.

 **Blocos de coroamento** ×



 **Lucas Soldador** +

Soldador

 **Mateus Lira** +

Encarregado

 **Alocados nesta atividade**

 **Davi Montador**

Montador

8

h ×

 **Pedro Ajudante**

Montador

8

h ×

✓ **Confirmar**

#	Campo	O que preencher
1	Alocados nesta atividade	—
2	Horas de cada um *	Obrigatório.
3	Confirmar	—

Atenção: Não é aceito: escrever o efetivo em observação, ou só o número de pessoas sem dizer quem.

8. Equipe de terceiro

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

"Abraão, 11 pessoas" deixa de ser anotação no papel: nome do cadastro, quantidade de pessoas, horas e — se houver medida física do dia — a produção.

 Apontamento de Subempreitada 

Tarefa do cronograma *

Estacas hélice contínua (un) 

Apenas tarefas com responsável "Subempreitada" são listadas.

Subempreiteiro *

1  Abraão Fundações — Fundações

2

3

4

Produt. (qtd/HH)

Observações

Cancelar 

#	Campo	O que preencher
1	Terceiro (do cadastro) *	Não está cadastrado? Peça o cadastro ao escritório.
2	Quantidade de pessoas *	É este número que responde depois "em quantos dias, com quantos homens".
3	Horas da equipe	—
4	Produção do dia	Só quando houver medida física (un, m ² , m ³). Sem medida, zero — registrar efetivo NÃO move o avanço.
5	Salvar	—

Atenção: Não é aceito: anotar "11 pessoas" em observação, ou pular o terceiro porque a atividade é nossa.

9. O avanço de quem andou hoje

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

Aponte só as atividades que andaram. Quantidade é a de HOJE; percentual é o ACUMULADO; marco só no dia em que ocorreu.

SIGE

RDOs

Veículos

manualrdo_encarregado

Fundações

Planejado

Realizado — Atrasado

10.1%

0.0%

2 subtarefas

Estacas hélice contínua

Terceiros

Concluído

1

Blocos de coroamento

Empresa

Total: 24 un · Acum: 0 un · Saldo: 24 un

2

un

2

Planejado

Realizado — Atrasado

7.0%

0.0%

Anterior 0.0% → +2 un hoje → 8.3% acumulado

Estrutura metálica

Planejado

Realizado — Atrasado

3.7%

0.0%

2 subtarefas

Montagem de pilares

Empresa

Ant: 0.0%

15

%

Planejado

Realizado — Atrasado

3.7%

0.0%

Anterior 0.0% → incremento +15.0 pp

Liberação da estrutura pela fiscalização

Empresa

Marco concluído

Planejado

Realizado — Em dia

0.0%

0.0%

#	Campo	O que preencher
1	Blocos: 2 hoje	—
2	Pilares: 15 % acumulado	—
3	Marco: em branco	A liberação ainda não aconteceu. Em branco.

Atenção: Não é aceito: repetir o número da véspera para "não deixar vazio", nem apontar 100 % "porque está quase acabando".

10. O que aconteceu, quando e qual o efeito

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

"Choveu" não é ocorrência. "Chuva das 10h às 14h, concretagem do bloco B3 adiada" é: diz o que, quando e o efeito.

Ocorrências

+ Adicionar

1

Tipo

2

Severidade

3

Descrição

Status

Clima

Média

4h — concretagem do bloco B3 adiada para amanhã

Pendente

Deixe vazio para não registrar ocorrências.

#	Campo	O que preencher
1	Tipo *	Obrigatório.
2	Severidade	—
3	O que, quando, efeito *	Obrigatório.

Atenção: Não é aceito: dia em que a produção caiu sem ocorrência que explique.

11. Três fotos, no mínimo

Quem faz: **o encarregado (apontador da obra)** · Onde: (mesma tela)

Uma da frente de serviço no início, uma do que foi executado, uma de cada ocorrência física. A foto tem de deixar ver ONDE é.

Relatório Diário de Obra (RDO)

Sistema moderno e intuitivo para registro de atividades diárias

Voltar

Informações Básicas

Obra

Gelejo Logístico Via Norte

Data do Relatório

06/21/2026

Clima geral

Envolado

Temperatura média

29°C

Condições de trabalho

Selecione

Equipamentos

Adicionar

Equipamento / Ferramenta

Deixe vazio para não registrar equipamentos.

Quantidade

Horas de uso

Estado de conservação

Ocorrências

Adicionar

Tipo

Severidade

Descrição

Status

Clima

Média

Chuva das 10h às 14h — correteagem do bloco B3 a

Pendente

Deixe vazio para não registrar ocorrências.

Apontamento de Produção — Cronograma

Expandir todos

Recolher todos

Filtrar tarefas por nome...

Fundações

2 subitens

Planejado

10.1%

Realizado — Atrasado

0.0%

Estacas hélice continua

Concluído

Estados de cronograma

2 itens

Total: 24 un

Acum.: 0 un

Selec.: 24 un

2

un

7.0%

Planejado

7.0%

Realizado — Atrasado

0.0%

Anterior 0.0% → +2 un hoje → 8.3% acumulada

Estrutura metálica

2 subitens

Planejado

3.7%

Realizado — Atrasado

0.0%

Montagem de pilares

2 itens

Av.: 0.0%

15

%

3.7%

Planejado

3.7%

Realizado — Atrasado

0.0%

Anterior 0.0% → incremento +15.0 pp

Liberação da estrutura pela fiscalização

2 itens

Marco concluído

0.0%

Planejado

0.0%

Realizado — Em dia

0.0%

SIQIE

RODs

Ativados

Instruções em carregado

Selecione fotos para anexar ao RDO

JPG, PNG, GIF, WEBP - máximo 5MB por foto

Câmera

Galeria

#1

foto1.png

4 KB

Legenda da foto #1

#2

foto2.png

5 KB

Legenda da foto #2

#3

foto3.png

6 KB

Legenda da foto #3

As fotos serão enviadas junto com o RDO quando você clicar em "Finalizar RDO"

Observações e Ocorrências

Observações Finais

Pré de serviço liberada às 7h. Chuva das 10h às 14h.

Voltar

Finalizar RDO

#	Campo	O que preencher
1	As fotos anexadas	—
2	Observações finais	—

Atenção: Ocorrência física (dano, interdição, material errado, alagamento) sem foto é motivo de devolução.

12. Salvo — mas ainda é rascunho

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

O RDO nasce em RASCUNHO: é o estado em que ainda se corrige à vontade, quantas vezes for preciso, durante o dia. Rascunho não lança custo — quem fecha o dia e lança o custo é o Submeter.

A imagem mostra a interface de um sistema de RDO. No topo, há um cabeçalho verde escuro com o ícone de uma pasta e o texto "Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026" e "RDO RDO-169871-2026-001". À direita, há uma barra lateral com botões: "Rascunho" (com um círculo 1), "Submeter" (com um círculo 2), "Exportar PDF" e "Voltar".

#	Campo	O que preencher
1	O estado: Rascunho	—
2	Submeter — o próximo passo	Os botões disponíveis mudam com o estado: são eles que dizem o que ainda dá para fazer.

Atenção: RDO esquecido em rascunho é dia sem fecho: sem assinatura, sem valor de documento, e o escritório não considera o dia lançado. É o sexto motivo da lista de devolução.

Ato 2 — Fechar o dia

Submeter, corrigir se preciso, assinar. Depois disso o documento não se mexe — se retifica.

13. Submeter: o fecho do dia

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdo/{rdo_id}

Submeter fecha o dia: é aqui que o custo de mão de obra é lançado e a medição é recalculada. A partir daqui o RDO só muda se o gestor reabrir. No fim do DIA, não no fim da semana.



Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-001

1

Preenchido

2

Assinar

Reabrir

Exportar PDF

Voltar

#	Campo	O que preencher
1	O estado: Preenchido	—
2	Assinar — o próximo passo	—

O que acontece: O dia está preenchido. O próximo botão é Assinar.

14. Errou? O gestor reabre

Quem faz: o gestor da obra · Onde: /rdo/{rdo_id}

Enquanto está PREENCHIDO, o RDO ainda é corrigível: o gestor reabre (com motivo), ele volta a rascunho, você corrige e submete de novo.



Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-001

1 Rascunho

2 Submeter

Exportar PDF

Voltar

#	Campo	O que preencher
1	Voltou a Rascunho	—
2	Submeter reapareceu	—

Atenção: O motivo é obrigatório e fica registrado. Aqui: "Faltou a hora da chuva na ocorrência".

15. Corrigiu, submete de novo

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdo/{rdo_id}

O mesmo botão. O histórico guarda a reabertura e a nova submissão.



Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-001

1

Preenchido

2

Assinar

Reabrir

Exportar PDF

Voltar

#	Campo	O que preencher
1	Preenchido outra vez	—
2	Assinar	—

16. Assinar: vira documento

Quem faz: **o encarregado (apontador da obra)** · Onde: `/rdo/{rdo_id}`

A assinatura é o que dá ao RDO valor de documento. Depois dela, nada mais é editado — de propósito.

Assinaturas

Papel	Assinado por	Cargo	Data/hora (UTC)	IP	Hash SHA-256
Executor	Mateus Lira	Encarregado	21/08/2026 17:28:11	127.0.0.1	221f77776ef3317c...

#	Campo	O que preencher
1	A assinatura registrada: quem, como e quando	Daqui em diante nenhum campo é editável.

Atenção: Nunca crie um segundo RDO do mesmo dia "por fora" para consertar. Ou se reabre antes de assinar, ou se retifica depois.

17. Aprovar: o aceite do gestor

Quem faz: o gestor da obra · Onde: /rdo/{rdo_id}

O gestor da obra aceita o dia. Estado final.

SIGE

100%

Atividade

monstado.gestor

RDO RDO-169871-2026-001

Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-001

Notificar

Exportar PDF

Voltar

Assinaturas

Posto	Assinado por	Cargo	Data/hora (UTC)	IP	Hash SHA-256
Executar	Matheus Lima	Encarregado	21/08/2026 17:28:11	127.0.0.1	2d777f4e7051...
Gestor	Carla Nunes	Gestor da obra	21/08/2026 17:28:15	127.0.0.1	2d777f4e7051...

2 SUBATIVIDADES EXECUTADAS

2 FUNCIONÁRIOS

7.5% PROGRESSO DIA OBRA

16.0h HORAS TRABALHADAS

Informações Básicas

Obra:

Galpão Logístico Vila Norte

Data:

21/08/2026

Criado por:

Matheus Lima

Criado em:

21/08/2026 17:27

Local:

Status:

Em andamento

Condições Climáticas

CLIMA LOCAL

Ensolelhado

TEMPERATURA MÉDIA

29°C

Observações Gerais

Fonte de serviço liberada às 7h. Chuva das 10h às 14h.

Produção do Dia — Cronograma V2

1 Blocos de armazenamento

Totais: 2.0 (0 us) / 0.0 (0 us) / 0.0 (0 us)

Planejado: 2.0%

Realizado: 0.0%

2 Montagem de pilares

Planejado: 5.7%

Realizado: 15.0%

Custos Gerados — Contas a Pagar

Atenção: Ao finalizar o RDO, custos de mão de obra (diários, VM e VT de diáristas) são lançados automaticamente em Contas a Pagar. Nenhum custo foi imputado vinculado a este RDO.

Ver Contas a Pagar desta obra

Ocorrências (1)

1 Ocorrência

2 Ocorrências

3 Ocorrências

4 Ocorrências

5 Ocorrências

6 Ocorrências

7 Ocorrências

8 Ocorrências

9 Ocorrências

10 Ocorrências

11 Ocorrências

12 Ocorrências

13 Ocorrências

14 Ocorrências

15 Ocorrências

16 Ocorrências

17 Ocorrências

18 Ocorrências

19 Ocorrências

20 Ocorrências

21 Ocorrências

22 Ocorrências

23 Ocorrências

24 Ocorrências

25 Ocorrências

26 Ocorrências

27 Ocorrências

28 Ocorrências

29 Ocorrências

30 Ocorrências

31 Ocorrências

32 Ocorrências

33 Ocorrências

34 Ocorrências

35 Ocorrências

36 Ocorrências

37 Ocorrências

38 Ocorrências

39 Ocorrências

40 Ocorrências

41 Ocorrências

42 Ocorrências

43 Ocorrências

44 Ocorrências

45 Ocorrências

46 Ocorrências

47 Ocorrências

48 Ocorrências

49 Ocorrências

50 Ocorrências

51 Ocorrências

52 Ocorrências

53 Ocorrências

54 Ocorrências

55 Ocorrências

56 Ocorrências

57 Ocorrências

58 Ocorrências

59 Ocorrências

60 Ocorrências

61 Ocorrências

62 Ocorrências

63 Ocorrências

64 Ocorrências

65 Ocorrências

66 Ocorrências

67 Ocorrências

68 Ocorrências

69 Ocorrências

70 Ocorrências

71 Ocorrências

72 Ocorrências

73 Ocorrências

74 Ocorrências

75 Ocorrências

76 Ocorrências

77 Ocorrências

78 Ocorrências

79 Ocorrências

80 Ocorrências

81 Ocorrências

82 Ocorrências

83 Ocorrências

84 Ocorrências

85 Ocorrências

86 Ocorrências

87 Ocorrências

88 Ocorrências

89 Ocorrências

90 Ocorrências

91 Ocorrências

92 Ocorrências

93 Ocorrências

94 Ocorrências

95 Ocorrências

96 Ocorrências

97 Ocorrências

98 Ocorrências

99 Ocorrências

100 Ocorrências

Mão de Obra (2 funcionários)

David Montador

Montador

0.0h

1 atividade

2 Blocos de armazenamento (0.00h)

Pedro Ajudante

Montador

0.0h

1 atividade

2 Blocos de armazenamento (0.00h)


Fotos do RDO (3 fotos)

#	Campo	O que preencher
1	O estado: Aprovado	—
2	O único botão que resta é Retificar	—
3	Duas assinaturas: quem executou e quem aprovou	—

18. Achou erro depois? Retifica

Quem faz: o gestor da obra · Onde: /rdo/{rdo_id}

Um documento de data não se apaga — se retifica. O sistema emite um NOVO RDO da mesma data, e marca o original como retificado. Os dois ficam, e a correção é rastreável.

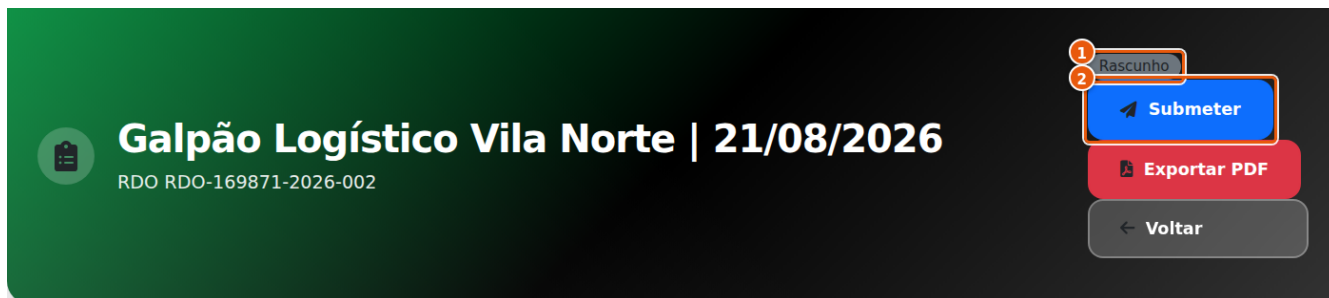

#	Campo	O que preencher
1	O retificador nasce em Rascunho	—
2	Preencha e submeta pelo mesmo caminho	—

O que acontece: Motivo registrado: "Quantidade de estacas do dia era 5, não 6". Preencha o retificador como o original, dizendo o que o primeiro deveria ter dito, e feche pelo mesmo caminho.
